

VIDEREUTVIKLING AV SYKEHUSET INNLANDET HF

Statusrapport – styringsgruppemøte 9. mars 2022

v/ Tom Einertsen



i dag

KSK -følgesevaluering

Hovedprogram

Framskrivning 2019 -2040

Virksomhetsinnhold – Mjøssykehuset

Virksomhetsinnhold – null-pluss

Tomteanalyse

Nedvalg 2 tomter

Valg av tomt for hvert alternativ

Valg av tomt

ARK/RI:
Mulighetsstudie
Mjøssykehuset

Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ n

Valgt alt.

ARK/RI:
Mulighetsstudie
erstatnings-
sykehus Hamar

Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ n

Valgt alt.

Alternativvurdering mellom
Mjøssykehuset med
tilhørende struktur og null-
pluss alternativet:

- Vurdering iht. godkjente vurderingskriterier
- Driftsøkonomiske utredninger
- Gevinstplan
- Bærekraftsanalyser

Overordnede driftsøkonomiske
utredninger

Vurdere hovedalternativ


B3A

Milepælsplan

Milepælsplan for konseptfasen (fokus på steg 1)	DATO	2021																																			
AKTIVITET	SG-møte/ Styremøte	Januar				Februar				Mars					April				Mai				Juni				Juli				August						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	
Styringsdokument	16.feb																																				
Mandat for tomteanalyse	16.feb																																				
Vurderingskriterier for virksomhetsinnhold	16.feb																																				
Virksomhetsinnhold for Mjøssykehuset	09.mar																																				
Forutsetningsnotat for tomteanalysen	09.mar																																				
Vurderingskriterer for tomtevalg	09.mar																																				
Virksomhetsinnhold for 0+ alternativet (erstatningssykehuset for Hamar)	06.apr																																				
Nedvalg til 2 tomter for både Mjøssykehuset og 0+ alternativet	06.apr																																				
Vurderingskriterer for valg mellom bygningsmessige konsepter	06.apr																																				
Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og 0+ alternativet	11.mai																																				
Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og 0+	11.mai																																				
Valg av tomt for både Mjøssykehuset og 0+	15.jun																																				
Fremlegge faglige utredninger slik at styringsgruppen kan vurdere valg mellom Mjøssykehuset eller 0+	15.jun																																				
Konseptrapport Steg 1 m/ vedlegg	08.aug																																				
KSK kort notat (status)	08.aug																																				
Helse Sør Øst styrebehandling konseptfase steg 1 (B3A)	25.aug																																				
Konseptrapport Steg 2 m/ vedlegg	04.nov																																				
KSK rapport	21.nov																																				
Styringsgruppebehandling konseptfase steg 2 (B3)	28.nov																																				
Helse Sør Øst styrebeslutning konseptfase steg 2 (B3)	15.des																																				

Beslutningsplan frem til B3A

Styringsgruppemøte (dato)	Beslutning
16. februar 2022 Dokumentasjon: 09.02.22	✓ Mandat til tomteanalyse ✓ Til orientering: Forutsetningsnotat for tomt ✓ Vurderingskriteriene for virksomhetsinnhold ✓ Oppdatert styringsdokument
9. mars 2022 Dokumentasjon: 02.03.22	• Virksomhetsinnhold i Mjøssykehuset • Forutsetningsnotat for tomteanalysen inkl. vurderingskriterier • Orientering om foreløpig resultat fra tomtesøk (grovsiling) • Vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie (orientering) • Brutto/ netto faktor
6. april 2022 Dokumentasjon: 30.03.22	• Virksomhetsinnhold i null-pluss alternativet (erstatningssykehus for Hamar) • Nedvalg til 2 tomter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet • Vurderingskriteriene for valg mellom bygningsmessige konsepter i mulighetsstudie • Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss alternativet (orientering) • Miljøplan/ miljømål til orientering
11. mai 2022 Dokumentasjon: 04.05.22	• Valg mellom bygningsmessige konsepter for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet • Rangere tomtealternativer – diskusjon og innspill. Tomteanalysen for begge alternativer sendes ut til kommuner og andre interessenter for innspill. • Vurderingskriteriene for valg mellom Mjøssykehuset og null-pluss alternativet
15. juni 2022 Dokumentasjon: 08.06.22	• Valg av tomt for både Mjøssykehuset og null-pluss alternativet • Fremlegge faglige utredninger slik at styringsgruppen kan vurdere valg mellom Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet
8. august Dokumentasjon: 01.08.22	• Konseptrapport/ hovedprogram for steg 1 • Retningsvalg: Mjøssykehuset eller null-pluss alternativet

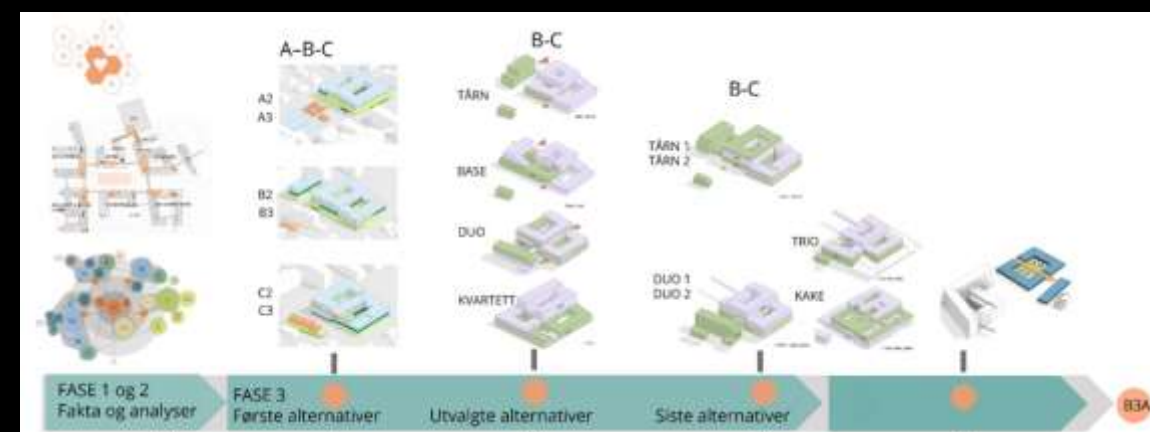

Kostnadssamendrag februar 2022 - Konseptfase					Inkl. mva.		
					UTFØRT		
ID	Post	Budsjett	Kontrakt	Prognose	Utført total	2021	2022
B1-00	Marginer og reserver						
B1-08	Generelle kostnader						
B1-082	Prosjektering						
B1-0821	ARK/RI				0		
B1-0829	Øvrige rådgivere				204 459		
B1-0829-01	Tomteanalyser				204 459		204 459
B1-0829-02	KSK				0		
B1-083	Administrasjon				5 580 581		
B1-0831	Prosjektorganisasjon				5 559 437	2 247 734	3 311 703
B1-084	Bikostnader				21 144		21 144
	Sum	75 000 000			5 806 184	2 247 734	3 537 306

Pos	Beskrivelse	Konsekvens	Tiltak
1	Alle aktiviteter i milepælsplanen må holdes for å opprettholde tidsplanen	B3A/ B3 beslutning forskyves	Omforent plan og bevissthet rund alle aktiviteter som skal gjennomføres
2	Høy arbeidsbelastning for nøkkelpersoner	B3A/ B3 beslutning forskyves	Fordele arbeidsoppgaver der det er mulig
3	Plan for funksjonsprogram må holdes og det er ikke rom for forsinkelser	B3A/ B3 beslutning forskyves	Gjennomføre iht. omforent plan
4	Gjennomføre mulighetsstudiet iht. stram tidsplan	B3A/ B3 beslutning forskyves	Etablere en omforent plan med riktig grad av medvirkning og nok ressurser fra arkitekt og rådgiver
5	Covid-19: • Sykdom blant nøkkelressurser • Gjennomføring med elektroniske møter når nødvendig	Forsinkelser	Organisasjonen er styrket og er mere robust.

Saker for kommende styringsgruppemøte

HELSE  SØR-ØST

Miljøprogram – plan for arbeidet

HELSE NORD

HELSE MIDT-NORGE

HELSE SØR-ØST

HELSE VEST

Standard for klima og miljø i sykehusprosjekter



SYKEHUSBYGG

Aktiviteter i konseptfasen

SYKEHUSBYGG

#	Oppgaver/Aktiviteter	Frist	Ansv	Dok.	Status
1	Delta i utarbeidelsen av vurderingskriterier for bygningsmessige konsepter og retningsvalg (Mjøssykehuset vs. Null-pluss) - er noe endret siden styresaken 058-2021 som påvirker klima og miljø?	Steg 1 6. april	Tom	Notat	Involvere COWI i midten av mars
2	Miljøprogram v1.0: Første versjon legges fram for Styringsgruppen til behandling	6.april	Tom	MP	50% Møte med HSØ
3	Modning av miljøprogram v2.0: Identifisere og vurdere «hovedgrep» for å oppnå miljømål (ev. revidere mål) - prosjektkostnader - verdi for sykehusdriften	Steg 2 Sept/okt	COWI	Notater	
4	Miljøprogram 2.0: Oppdatert miljøprogram med miljømål og delmål/hovedgrep - inkl. Avklare om prosjektet skal BREEAM-NOR sertifiseres (Pre-analyse)	Nov	Tom	MP	
5	Utarbeide Miljøoppfølgingsplan v1.0 (MOP)	Nov	COWI	MOP	
6	Erfaringsoverføring fra referanseprosjekter	Nov		Notat	
7	Klima og miljøkapittel i Konseptrapport (oppsummering/hovedgrep)	Nov			

HELSE SØR-ØST
